
HD-PLM / 新品协同

制造负责人及部门成员

# 生产部
# 软件操作 SOP

从接收项目到整机完成
让每一个零件的完成时间清楚可追溯

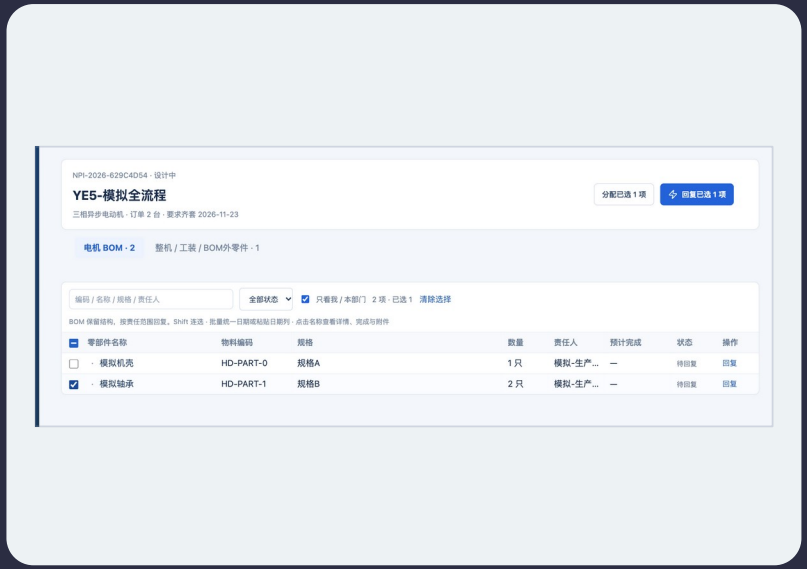


接收项目　回复交期　确认完成

图文操作培训 · 可编辑课件

适用版本 4.2.1　2026 年 11 月

# 生产每天围绕这四步工作

主要入口：生产任务 → 项目卡片 → 电机 BOM

1

## 接项目

核对型号 / 订单 / 版本

2

## 定分工

自制留生产，外购转采购

3

## 回日期

预计完成，改期留原因

4

## 报完成

核实实物，再填实际日期

**制造负责人**

接收 BOM 默认任务，确认分工与要求，组织整机、工装和 BOM 外件交付。

**部门成员**

处理本部门可回复任务，系统保留主负责人和实际操作人；交班先读最新记录。

项目阶段记录、试验分析和客户反馈由项目负责人统一填写；生产提供现场事实与依据。

# 先开通账号，再开始工作

登录入口 → 注册新用户 → 部门审核 → 登录




## 1 提交注册申请

姓名、邮箱、密码；类别选“生产 / 制造”，所属部门选实际部门。

## 2 等管理员确认开通

注册成功不等于账号已启用；收到开通确认后再登录。

## 3 使用自己的账号

管理员创建或重置的账号按提示改密；公共设备退出登录。

生产部培训账号与正式账号分开使用。手机使用公司可访问地址，不能输入电脑的 localhost 。

# 先选电机项目，再找零件

生产任务 → 项目卡片 → 电机 BOM




实机截图 · 关键区域已放大

## 1 核对项目身份

项目编号、电机型号、订单台数和当前 BOM 版本。

## 2 优先处理待回复

搜索编码 / 名称 / 规格；按待回复、风险、逾期筛选。

## 3 检查责任范围

只对本人 / 本部门范围回复；点零件名称看详情、日期和附件。

BOM 显示单台用量；备料或生产总需求还需结合订单台数和实际任务范围核对。

# 外购件选好后，直接转采购

电机 BOM 勾选零件 → 分配已选 N 项




实机截图 · 关键区域已放大

### 1 选择采购责任人

制造负责人确认外购范围；同类零件可 Shift 连选。

### 2 写要求与原因

按需填写统一要求日期，说明转采购依据；每批最多 200 项。

### 3 保存并确认接收

核对责任人已更新，让采购在采购管理中找到同一项目与零件。

备注里写“转采购”不会改变分配。没有分配入口的成员请制造负责人办理。

# 同一天完成，一次批量回复

生产任务 → 项目 → 批量回复完成时间







同一窗口的填写区与底部提交区（已省略中间空白）

## 1 选范围

勾选需要回复的行；每批最多 50 项。

## 2 填日期

统一填写日期 → 统一填入；再逐行核对。

## 3 点提交

点击“提交 N 项回复”，看到成功提示再离开。

“统一填入”只填表格；提交成功才保存。 100 行显示 ≠ 可以一次提交 100 项。

适用 HD-PLM 4.2.1 · 2026.11 · 界面与数据为操作演示

# 日期不同，也能连续快速录入

按当前行顺序粘贴日期列，或用键盘连续填写

## 把日期列粘贴到第一条目标行

| 编码 / 行号 | 本次日期 |
| --- | --- |
| P-101 · 行 6 | 2026-11-20 |
| P-102 · 行 7 | 2026-11-21 |
| P-103 · 行 8 | 2026-11-21 |

**Enter**
下一行

**Shift + Enter**
上一行


**Ctrl / ⌘ + D**
沿用上一行

**Ctrl / ⌘ + Enter**
核对后提交

粘贴前对齐编码、原表行号和顺序；重复编码不能只靠名称匹配。

# 实物完成后，再确认实际日期

批量回复完成时间 → 实际完成

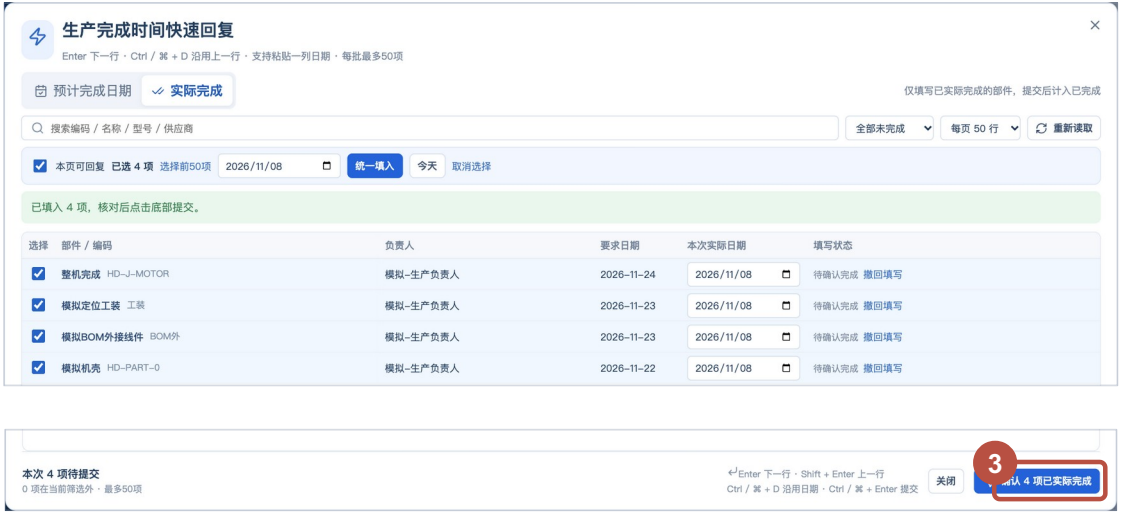


同一窗口的填写区与底部提交区（已省略中间空白）

### 1 先核事实

数量、工序和交付范围已完成；未完成项不要选中。

### 2 填真实日期

统一填入或逐项填实际完成日期，不能填写未来日期。

### 3 确认提交

点击“确认 N 项已实际完成”，检查日期与状态已更新。

整机是一项整体任务。只完成部分订单台数时，记录已完成与剩余数量，整机保持未完成。

# 整机、工装和 BOM 外件也要回

生产任务 → 项目 → 整机 / 工装 / BOM 外零件




实机截图 · 关键区域已放大

## 1 查看补充任务

核对整机编码、工装名称及 BOM 外件的数量和要求。

## 2 按同一方式回复

预计完成 → 改期说明 → 实际完成，均保留历史。

## 3 缺项先补清单

请有维护权限人员在交付任务中添加；不要重复建立 BOM 已有件。

整机编码来自项目电机编码；有误请项目负责人修改项目信息。

# 照片和说明跟着具体任务走

点击零件名称 → 附件；阶段资料交项目负责人汇总







同一附件窗口的拍照区与文件上传区

### 1 关联正确零件

上传前核对编码、规格、项目和 BOM 版本。

### 2 提供可判断依据

实物与标识、加工 / 装配、工装准备、异常部位或交付状态。

### 3 把异常交接清楚

写明数量、影响、措施、责任人与恢复日期；有权时更新关联问题。

任务附件用于零件事实；阶段照片和阶段结论由项目负责人在项目流程中统一维护。

# 遇到异常，按这个顺序处理

先核对状态，再决定改期、复核或升级协调

## 1 找不到项目 / 零件

清空搜索和状态筛选 → 核对责任人、部门 → 请制造负责人或项目负责人确认分配。

## 2 已回复但要改期

筛选“已回复 / 改期” → 填新日期与具体原因 → 提交；首次承诺保留。

## 3 待 BOM 复核 / 已转交

先由项目负责人确认版本或交接关系；无权限时联系当前责任人。

## 4 提交失败 / 数据已变化

保留当前页，点“重新读取”核对最新值；已保存的项不要再次提交。

一批中有无效项时整批不会保存；修正提示后重新提交。不要把网络超时直接当作成功。

# 生产部上岗演练

用演示项目练一次，再开始处理正式业务

1. 在项目中找到自己的 3 项零件；把外购件转采购。
2. 给 2 项填同一预计日期，确认提交成功。
3. 让同部门成员接手读取最新记录，核对操作历史。
4. 确认其中 1 项实际完成，另一项如实改期并填写原因。

**验收：采购看到转交任务，未完成项仍未完成，实际完成和改期原因均可查。**
